

Allgemeine und energetische Sanierung Grundschule Ludwig Uhland
 (Maßnahme: 2.1.1.1.011/5001.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
Zeiträume	Projektzeitraum	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert)	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert)
	Bewilligungszeitraum	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert)	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert)
	Verwendungsnachweis	05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung) 19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert) 10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert) 03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert) 16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)	05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung) 19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert) 10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert) 03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert) 16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	3.870.908,23 € HH 22: +1.175.659,43 €	05.09.2017: 164.875,78 €	05.09.2017: 1.154.130,50 € 10.06.2021: 1.264.215,99 €
	Zwischensumme	1.429.091,77 €	
	Gesamtsumme	6.475.659,43 €	

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 27.04.22)
Allgemein: 1.573.743,17 €	3.527.208,99 €	4.997.285,91 €	359.144,05 €	5.356.429,96 €	
Energetisch: 1.648.757,87 €		5.248.904,72 €	1.241.601,96 €	6.490.506,68 €	
Gesamt: 3.222.501,04 €					

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet + Vergabe aufgehoben)				
Los 01 – Abbrucharbeiten		Los 11 – erw. Rohbau	Los 16 - Metallarbeiten	Los 21 – Bodenbelag
Los 02 – Aufzugsschacht	Los 07 – Bauwerksabdichtung	Los 12 – Fenster	Los 17 – Tischler	Los 22 - Schließanlage
Los 03 – Stahlbeton/-bau	Los 08 – H/L/S	Los 12.1 - Bestandsfenster	Los 18 – Schlosser	Los 23 – Bauendreinigung
Los 04 – Gerüstbau	Los 09 – Starkstrom	Los 13 – Trockenbau und Dämmarbeiten	Los 19 – Maler/Lackierer	Los 24 – Erdung/Blitzschutz
Los 05 – Innenputzarbeiten	Los 10 – Schwachstrom	Los 14 – Fassade und Klempner	Los 20 – Fliesen/Platten	Los 25 Dachabdichtungsarbeiten
Los 06 – Dachdeckerarb.	Los 40 - Aufzug	Los 15 – Estrich	Los 100 Baustelleneinrichtung	Los 26 Schlossarbeiten Sternwarte
Los 27 -Tischlerarbeiten Außentüren	Los 301 SiGeKo	Los 302 Holzschutzgutachten	Los 300 Bauschild	

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Grundschule
Ludwig Uhland**



BAUABLAUFPLAN		Bauvorhaben																						
Stand: 25.08.2021		Umbau und energetische Sanierung Grundschule "Ludwig Uhland", Kirchplatz 1, 39418 Staßfurt																						
		Architekt KIRCHNER + PRYZBOROWSKI Dipl.-Ing. Ulrich Radtke, Freyweg 7, 39288 Burg Mob: 0176 492233 e-mail: radtke@kirchner-pryzborowski.de																						
Los	Bauabschnitt/Gewerk	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mal	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mal	Juni	Juli	August	September
		Jahr 2020			Jahr 2021												2022							
07	Bauwerksabdichtung Fa. Ullmann Spezialbetrieb für Bauwerkabdichtung, Dessau			01.02		13 Wochen		30.04																
04	Gerüstarbeiten Fa. Gerüstbauunion GmbH, Landsberg				01.03																			18.12
06	Dachdeckungs-, Zimmer- und Dachklempnerarbeiten Fa. KURCH Bedachungs GmbH, Köthen					15.03																		30.11
14	Fassaden- und Fassadenklempnerarbeiten Fa. H&B Holz-Bauferschutz und Sanierung GmbH, Schönebeck					22.03																		30.10
12	Fassade: Fenster Fa. Tischlerei Gerhard Drogan GmbH, Krauschwitz								03.05															30.09
03	Stahlbeton- und Stahlbauarbeiten Fa. EURO-BAU GmbH Möckern		05.11																					28.05
05	Innenputzarbeiten Fa. H&B Bau GmbH, Wanleben am See				22.02																			06.09
																								12 Wochen
																								19.11
11	Erweiterte Rohbauarbeiten Fa. Föckler + Partner GmbH, Neundorf																							13.09
																								11 Wochen
																								19.11
15	Estricharbeiten und Lewisdecken Fa. KFK Estrichbau GmbH, Torgau																							19.04
																								7 Wochen
																								13 Wochen
																								08.10
13	Trockenbau- und Dämmarbeiten Fa. Wallinr. Ausbau- und Fassaden GmbH, Magdeburg																							27.09
																								04 Wochen
																								15.04
16	Metallarbeiten Fa. meko-Metallbau-Konstruktion GmbH, Droyßig OT Weißenborn																							01.12
																								13 Wochen
																								31.03
18	Schlossarbeiten Fa. Herman & Kolk VT GmbH, Halle (Saale)																							01.11
																								29.04
17	Tischlerarbeiten: Innentüren und -fenster Fa. Herman & Kolk VT GmbH, Halle (Saale)																							10.01
																								13 Wochen
																								08.04
21	Bodenbelagsarbeiten Fa. Raumausstatter GmbH, Bernburg																							10.01
																								17 Wochen
																								06.05
20	Fleisen- und Plattenarbeiten Fa. Fleisen- und Ausbautechnik Duczmal, Magdeburg																							10.01
																								17 Wochen
																								06.05
19	Maler- und Lackierarbeiten Fa. Wallinr. Ausbau- und Fassaden GmbH, Magdeburg																							10.01
																								22 Wochen
																								10.06
27	Haustechnik: Sanitär, Heizung, Lüftung Fa. Dik Thomann GmbH, Eckendorf																							29.03
																								31.05
26	Haustechnik: Elektroinstallationen (Stark-, Schwachstrom) Fa. Bolkjan GmbH, Bernburg																							29.03
																								31.05
25	Blitzschutz Fa. Helmcke GmbH, Oschersleben																							21.06
																								01.11
																								29.04
22	Schließanlage Fa. Schilder und Werbung H.-J. SöB, Stendal																							18.04
																								31.05
23	Beschlädigung, Feuerwehrlöcher Fa. Schilder und Werbung H.-J. SöB, Stendal																							18.04
																								31.05
24	Baureinigung Fa. Schilder und Werbung H.-J. SöB, Stendal																							14.05
																								24.06
	Ausstattung/ Möblierung																							27.06
																								15.07
																								18.07. Übergabe

Grundschule Ludwig Uhland – Außenanlagen

(Maßnahme: 2.1.1.1.011/5087.7851000)

Zeiträume	Zuwendungsbescheid	
	Bewilligungszeitraum	25.03.2020: 01.07.2017 – 31.12.2022
	Verwendungsnachweis	6 Monate nach letzter Auszahlung

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt		Zuwendungsbescheid	
	215.300,00 € HH 22: + 362.250,00 €		25.03.2020: 362.250,00 €	
	Gesamtsumme		939.800,00 €	

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 25.03.2020	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 27.04.22)
	402.500,00 €	418.234,67 €	243.927,35 € 632.304,66 €	427.234,67 € 306.808,70 €	671.162,02 € 939.113,36 €

Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los - Freianlagenplanung	Los – Abbrucharbeiten	Los – SW und RW	Los - Außenanlage	Los - Rampe

Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Plattengebäude
 (Maßnahme: 2.1.1.1.012/5003.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
Zeiträume	Projektzeitraum	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert)	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert)
	Bewilligungszeitraum	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert)	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert)
	Verwendungsnachweis	04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung) 26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)	04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung) 26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Projektdurchführungsvertrag Salzlandkreis	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	2.076.272,44 € HH 22: + 1.901.402,56 €	20.04.2018: 1.022.325,00 €	04.03.2019: 422.533,90 €	04.03.2019: 1.478.868,66 €
Zwischensumme	5.000.000,00 €		1.901.402,56 €	
Gesamtsumme	6.901.402,56 €			

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 04.03.2019	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 27.04.22)
Allgemein: 1.013.290,02 €	4.298.860,46 €	4.668.321,47 €	431.169,50 €	5.099.490,97 €	
Energetisch: 2.112.669,51 €					4.892.687,80 €
Gesamt: 3.125.959,53 €					

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los 01 – Vermessung	Los 11 – Baustrom	Los 20 – WDVS	Los 28 – Elektro	Los 34.1 – Innenwände
Los 02 – Baugrund	Los 12 – Abbruch Vordach	Los 20.1 – Außenwände	Los 29 – H/L/S - TGA	Los 34.2 – Decken
Los 03 – Schadstoff	Los 13 – SiGeKo	Los 21 – Abbr./Maurer/ Putz	Los 30 – Schlosser	Los 35 – Rohbau
Los 04 – Gutachten Tragw.	Los 14 – Baustelleneinrich.	Los 21.1 – Abbruch	Los 31 – Bodenbelag	Los 35.1 – Bauk. Einbaut.
Los 05 – Elektroanlage	Los 15 – Gerüst	Los 22 – Kamerabefahrung	Los 32 – Trockenbau	Los 35.2 – zus. Maßnah.
Los 06 – Bauschild	Los 16 – Dachabdichtung	Los 23 – Betonarbeiten	Los 32.1 – Kellerdecke	Los 35.3 – sonst. Maßn.
Los 07 – Brandschutzkonz.	Los 16.1 – Lichtkuppeln	Los 24 – WC-Trennwände	Los 32.2 – Innenwände	Los 36 – Gerüstunterkonst.
Los 08 – H/L/S	Los 18 – Fenster	Los 25 – Schweißarbeiten	Los 32.3 – Decken	Los 37 – Blitzschutz 2
Los 09 – Erstellung LV	Los 18.1 - Sonnenschutz	Los 26 – Abbruch Ausgänge	Los 33 – Innentüren	Los 39 – Fliesen
Los 10 – Bauwasser	Los 19 – Metall	Los 27 – Bauschließanlage	Los 34 – Maler	Los 44 – WC-Trennwände 2
Los 42 - Festellanlagen	Los 43 – Nachrüstung statische Brandfallsteuerung	Los 45 Schlosser 3 Steigleitern	Los 46 Sockelabdichtung Fassade	Los 48 Treppenhaus Gerüste
Los 17 – Blitzschutzanlage	Los 49 – Beschilderung	Los 50 Bauendreinigung		

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Schulzentrum Nord
Plattengebäude**



Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Mehrzweckgebäude
 (Maßnahme: 2.1.1.1.012/5077.7851000)


		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
Zeiträume	Projektzeitraum	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert)	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert)
	Bewilligungszeitraum	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert)	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert)
	Verwendungsnachweis	10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)	10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	1.572.009,14 € HH 22: + 827.990,86 €	10.07.2019: 183.997,97 €	10.07.2019: 643.992,89 €
Zwischensumme	2.400.000,00 €	827.990,86 €	
Gesamtsumme	3.227.990,86 €		

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 27.04.22)
Allgemein: 523.175,43 €	1.826.905,85 €	2.070.323,31 €	190.437,13 €	2.260.760,44 €	
Energetisch: 919.989,84 €		2.157.824,52 €	2.52.419,69 €	2.410.244,21 €	
Gesamt: 1.443.165,27					

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los 01 – Schadstoff	Los 06 – Gutachten Tragwerk	Los 11 – H/L/S	Los 15 - Dachabdichtung	Los 20 - Trockenbau
Los 02 – Gerüst Bauschild	Los 07 – Baustrom	Los 12 – nicht konstr. Abbruch	Los 16 – Fenster / Sonnenschutz	Los 21- Innentüren
Los 03 – Bauschild	Los 08 – Bauwasser	Los 13 – erw. Rohbau	Los 17 – Metall	Los 22 – Maler
Los 04 – Brandschutz-konzept	Los 09 – SiGeKo	Los 14 – Gerüst	Los 18 – WDVS	Los 23 – Bodenbelag
Los 05 – Grundleitungs-untersuchung	Los 10 - Elektro	Los 14 (2) - Baustelleneinrichtung	Los 19 – Estrich	Los 24 – Fliesen
Los 25 - Bauschließanlage	Los 26 - Rohbau 2	Los 27 – Schließanlage	Los 28 – Bauendreinigung	Los 29 – Beschilderung
Los 31 – WC Trennwände 2				

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Schulzentrum Nord
Mehrzweckgebäude**

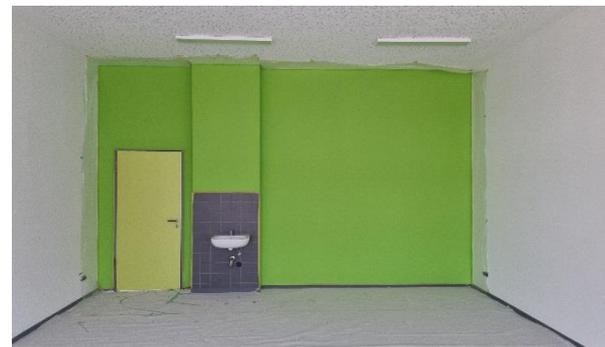

Datum: 2021-08-20, Baustellenplan_MZG.PPL				Baustellenplan																	Seite 1 von 1											
Projektnummer: 2057				Sanierung Schulzentrum Nord, BT: MZG, Straße der Solidarität 42, 30418 Staßfurt																												
				August 2021				September 2021				Oktober 2021				November 2021				Dezember 2021			Januar 2022									
				KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5					
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																												
1	Sanierung Bauteil MZG	156t	Mo, 23.08.21	Fr, 04.02.22	[Red bar across all weeks]																											
1.1	Los 20 - Trockenbauarbeiten, Einbau Trockenbauwände und Vorsatzschalen	5t	Mo, 23.08.21	Fr, 27.08.21	[Blue bar in KW 34]																											
1.2	Los 11 - HL8, Rohinstallation	26t	Mo, 23.08.21	Fr, 17.09.21	[Blue bar in KW 34]																											
1.3	Los 10 - Elektro, Rohinstallation	40t	Mo, 23.08.21	Fr, 01.10.21	[Blue bar in KW 34]																											
1.4	Los 15 - Dacharbeiten, Einbau Dämmung und Abdichtung	30t	Mo, 23.08.21	Fr, 01.10.21	[Blue bar in KW 34]																											
1.5	Los 19 - Estricharbeiten, Einbau des Estrichs	10t	Mo, 30.08.21	Fr, 10.09.21	[Blue bar in KW 35]																											
1.6	Los 18 - WDVS oberhalb des Sockels einbauen	30t	Mo, 30.08.21	Fr, 08.10.21	[Blue bar in KW 35]																											
1.7	Los 16 - KS-Fenster, Einbau Außen-Fensterbänke und Sonnenschutzvorrichtungen	5t	Mo, 13.09.21	Fr, 17.09.21	[Blue bar in KW 37]																											
1.8	Los 21 - Innentüren, Einbau aller Innentüren	5t	Mo, 13.09.21	Fr, 17.09.21	[Blue bar in KW 37]																											
1.9	Los 20 - Trockenbauarbeiten, Einbau Trockenbaudecken	25t	Mo, 13.09.21	Fr, 15.10.21	[Blue bar in KW 37]																											
1.10	Los 16 - KS-Fenster, Einbau Innen-Fensterbänke	5t	Mo, 27.09.21	Fr, 01.10.21	[Blue bar in KW 39]																											
1.11	Los 17 - Metallarbeiten, Montage der Innentüren	5t	Mo, 11.10.21	Fr, 15.10.21	[Blue bar in KW 41]																											
1.12	Los 14 - Gerüst, Abbau des Fassadengerüsts	5t	Mo, 11.10.21	Fr, 15.10.21	[Blue bar in KW 41]																											
1.13	Los 22 - Malerarbeiten	52t	Mo, 11.10.21	Di, 21.12.21	[Blue bar in KW 41]																											
1.14	Los 13 - erweiterter Rohbau, Gebäudesockel und Arbeiten in den Außenbereichen	15t	Mo, 18.10.21	Fr, 05.11.21	[Blue bar in KW 43]																											
1.15	Los 18 - WDVS-Sockel einbauen	15t	Mo, 01.11.21	Fr, 19.11.21	[Blue bar in KW 45]																											
1.16	Los 24 - Fliesenarbeiten	25t	Mo, 15.11.21	Fr, 17.12.21	[Blue bar in KW 47]																											
1.17	Los 23 - Bodenbelagarbeiten	20t	Mo, 22.11.21	Fr, 17.12.21	[Blue bar in KW 47]																											
1.18	Arbeitspause über den Jahreswechsel	12t	Mi, 22.12.21	Fr, 07.01.22	[Blue bar in KW 52]																											
1.19	Bauendreinigung	5t	Mo, 10.01.22	Fr, 14.01.22	[Blue bar in KW 1]																											
1.20	Behördliche Abnahmen	20t	Mo, 10.01.22	Fr, 04.02.22	[Blue bar in KW 1]																											

Projektziele: von Mo, 23.08.21 bis So, 06.02.22
 Kalender: Sachsen-Anhalt
 Druckdatum: 20.08.2021 11:57
 Filter:
 Bearbeiter: Schweichler

Wohrab Landeck & Cie.
 Ingenieurplanungsgesellschaft mbH
 Magdeburger Str. 24
 D-06449 Ascherleben
 Tel: +49 3473 221520
 Fax: +49 3473 2215205
 e-Mail: info@wohrab-landeck.de

Schulzentrum Nord – Freianlagenplanung

(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5081.7851000)

Zeit- räume	Zuwendungsbescheid	
	Zeiträume	ohne Fördermittel

Finanzie- rungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt		Zuwendungsbescheid	
	1.191.200,00 €		0,00 €	
	Gesamtsumme		1.191.200,00 €	

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 27.04.22)
---	1.218.091,69 €	790.271,61 €	684.887,71 €	1.475.159,32 €	
		1.415.115,76 €	174.902,67 €	1.590.018,43 €	

Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los 01 - Freianlagenplanung	Los 02 – Fernwärme	Los 03 – Grundleitungen BT Schule und MZG	Los 04 – Außenanlagen BT MZG	Los 05c – Außenanlagen BT Schule
Los 06 - SiGeKo	Los 07 - Baustelleneinrichtung			

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Schulzentrum Nord
Außengelände**



Budget Übersicht

Maßnahme	Finanzierungsplan - Gesamt	Kostenplan - Gesamt	Differenz
GS Umland	6.475.659,43 €	6.490.506,68 €	- 14.847,25 €
GS Umland - Außenanlage	939.800,00 €	939.113,36 €	+ 686,64 €
SZ Nord – Plattengebäude	6.901.402,56 €	5.278.468,15 €	+ 1.622.934,41 €
SZ Nord – Mehrzweckgebäude	3.227.990,86 €	2.410.244,21 €	+ 817.746,65 €
SZ Nord – Außenanlage	1.191.200,00 €	1.590.018,43 €	- 398.818,43 €
Gesamt	18.736.052,85 €	16.708.350,83 €	+ 2.027.702,02 €
