

Allgemeine und energetische Sanierung Grundschule Ludwig Uhland
 (Maßnahme: 2.1.1.1.011/5001.7851000)


		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
Zeiträume	Projektzeitraum	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert)	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert)
	Bewilligungszeitraum	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert)	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert)
	Verwendungsnachweis	05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung) 19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert) 10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert) 03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert) 16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)	05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung) 19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert) 10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert) 03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert) 16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	3.870.908,23 € HH 22: +1.175.659,43 €	05.09.2017: 164.875,78 €	05.09.2017: 1.154.130,50 € 10.06.2021: 1.264.215,99 €
Zwischensumme	5.046.567,66 €	1.429.091,77 €	
Gesamtsumme	6.475.659,43 €		

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 21.06.22)
Allgemein: 1.573.743,17 €	3.527.208,99 €	5.248.904,72 €	1.241.601,96 €	6.490.506,68 €	
Energetisch: 1.648.757,87 €		5.704.208,26 €	295.791,74	6.000.000,00 €	
Gesamt: 3.222.501,04 €					

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet + Vergabe aufgehoben)				
Los 01 – Abbrucharbeiten		Los 11 – erw. Rohbau	Los 16 - Metallarbeiten	Los 21 – Bodenbelag
Los 02 – Aufzugsschacht	Los 07 – Bauwerksabdichtung	Los 12 – Fenster	Los 17 – Tischler	Los 22 - Schließanlage
Los 03 – Stahlbeton/-bau	Los 08 – H/L/S	Los 12.1 - Bestandsfenster	Los 18 – Schlosser	Los 23 – Bauendreinigung
Los 04 – Gerüstbau	Los 09 – Starkstrom	Los 13 – Trockenbau und Dämmarbeiten	Los 19 – Maler/Lackierer	Los 24 – Erdung/Blitzschutz
Los 05 – Innenputzarbeiten	Los 10 – Schwachstrom	Los 14 – Fassade und Klempner	Los 20 – Fliesen/Platten	Los 25 Dachabdichtungsarbeiten
Los 06 – Dachdeckerarb.	Los 40 - Aufzug	Los 15 – Estrich	Los 100 Baustelleneinrichtung	Los 26 Schlossarbeiten Sternwarte
Los 27 -Tischlerarbeiten Außentüren	Los 301 SiGeKo	Los 302 Holzschutzgutachten	Los 300 Bauschild	Los 30 Kücheninstallation
Los 31 Sonnenschutz				

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Grundschule
Ludwig Uhland**

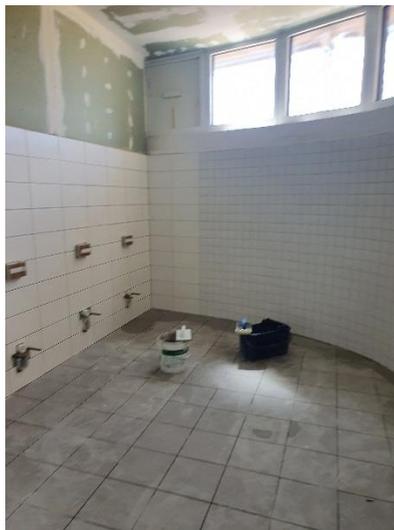

Aktualisierung Stand 09.06.2022 - ENTWURF	Monat						
	15. Mai	15. Juni	15. Juli	15. August	15. September	15. Oktober	15. November
1001.7 Fassade: Fenster Fa. Tischlerei Gerhard Drogala GmbH, Kraachwitz ES WC							
1001.7 Innenputzarbeiten Fa. M&B Bau GmbH, Worsleben am See							
1001.11 Erweiterte Rohbauarbeiten Sanitäräume Decke Schachtwand 2 OG Sanitäräume Decke Schachtwand 1 OG TH 3 Zugang DG Restleistungen Fa. Fickler + Partner GmbH, Neustorf							
1001.11 Trockenbau- und Dämmarbeiten Fa. Wallentin Ausbau- und Fassaden GmbH, Magdeburg							
Decken Decken EG Räume Decken Flure 2 OG Decken Flure 1 OG Decken Flure EG Schachtwände EG Haustechnikverkleidung Wände Decken Sanitäräume Wände 2 OG 1 OG Koffer TGA DG Dämmung Restleistungen							
1001.11 Metallarbeiten Fa. Metal-Metalbau-Konstruktion GmbH, Dreyßig Of Weßendorf Abschlußflagen 2 OG - EG Inbetriebnahme Eisenstellungen							
1001.11 Schlosserarbeiten Fa. Kuenin Absturzicherung Fenster Treppenanlage 2 OG - EG Treppen Handläufe 2 OG / DG Treppengeländer Dachaufstieg Treppe							
1001.11 Tischlerarbeiten: Innentüren und -fenster Fa. Herrman & Kohl Vt GmbH, Heile (Siedle) EG 2 OG Türblätter Sanitärwände EG und DG							
1001.11 Bodenbelagsarbeiten Fa. Raumstruktur GmbH, Bernburg 2. OG Flure/Räume 1. OG Flure/Räume EG Räume EG Flure/Restleistungen							
1001.11 Fliesen- und Plattenarbeiten Fa. Fliesen- und Ausbautechnik Daxmal, Magdeburg Fliesenpiegel WT + Sanitär 2. OG Fliesenpiegel WT + Sanitär 1. OG Fliesenpiegel WT + Sanitär EG Küche EG TRN 3 TRN 2 TRN 1							
1001.11 Maler- und Lackierarbeiten Fa. Wallentin Ausbau- und Fassaden GmbH, Magdeburg 2. OG Flure 1. OG Flure EG Flure 2 OG Sanitär 1. OG Sanitär EG Sanitär Räume EG Wände Decken Restarbeiten							
1001.11 Haustechnik: Sanitär, Heizung, Lüftung Fa. Dirk Thermann GmbH, Eickendorf 2. OG Sanitär 1. OG Sanitär EG Inbetriebnahmen, Wasserproben							
1001.21 Haustechnik: Elektroinstallationen (Stark-,Schwachstrom) Fa. Bolduan GmbH, Bernburg Montage Lampen/Schalter 2. OG 1. OG EG Inbetriebnahmen							
1001.11 Blitzschutz Fa. Helmcke GmbH, Oschersleben							
1001.11 Schließanlage offen							
1001.11 Beschilderung, Feuerwehrlinie offen							
1001.11 Kautionierung offen							
1001.11 Bauordnungstechnische Abnahme Übergabe Nutzer							

Grundschule Ludwig Uhland – Außenanlagen

(Maßnahme: 2.1.1.1.011/5087.7851000)

Zeiträume	Zuwendungsbescheid	
	Bewilligungszeitraum	25.03.2020: 01.07.2017 – 31.12.2022
	Verwendungsnachweis	6 Monate nach letzter Auszahlung

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid
	215.300,00 € HH 22: + 362.250,00 €	25.03.2020: 362.250,00 €
	Gesamtsumme	939.800,00 €

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 25.03.2020	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 21.06.22)
	402.500,00 €	418.234,67 €	632.304,66 € 651.358,54 €	306.808,70 € 64.306,33	939.113,36 € 715.664,87 €

Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los - Freianlagenplanung	Los – Abbrucharbeiten	Los – SW und RW	Los - Außenanlage	Los - Rampe

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Grundschule
Ludwig Uhland
Außengelände**



Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Plattengebäude
 (Maßnahme: 2.1.1.1.012/5003.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
Zeiträume	Projektzeitraum	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert)	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert)
	Bewilligungszeitraum	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert)	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert)
	Verwendungsnachweis	04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung) 26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)	04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung) 26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Projektdurchführungsvertrag Salzlandkreis	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	2.076.272,44 € HH 22: + 1.901.402,56 €	20.04.2018: 1.022.325,00 €	04.03.2019: 422.533,90 €	04.03.2019: 1.478.868,66 €
	Zwischensumme	5.000.000,00 €		1.901.402,56 €
Gesamtsumme	6.901.402,56 €			

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 04.03.2019	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 21.06.22)
Allgemein: 1.013.290,02 €	4.298.860,46 €	4.892.687,80 €	385.780,35 €	5.278.468,15 €	
Energetisch: 2.112.669,51 €					4.877.671,84 €
Gesamt: 3.125.959,53 €					

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet+ Gekündigt)				
Los 01 – Vermessung	Los 11 – Baustrom	Los 20 – WDVS	Los 28 – Elektro	Los 34.1 – Innenwände
Los 02 – Baugrund	Los 12 – Abbruch Vordach	Los 20.1 – Außenwände	Los 29 – H/L/S - TGA	Los 34.2 – Decken
Los 03 – Schadstoff	Los 13 – SiGeKo	Los 21 – Abbr./Maurer/ Putz	Los 30 – Schlosser	Los 35 – Rohbau
Los 04 – Gutachten Tragw.	Los 14 – Baustelleneinrich.	Los 21.1 – Abbruch	Los 31 – Bodenbelag	Los 35.1 – Bauk. Einbaut.
Los 05 – Elektroanlage	Los 15 – Gerüst	Los 22 – Kamerabefahrung	Los 32 – Trockenbau	Los 35.2 – zus. Maßnah.
Los 06 – Bauschild	Los 16 – Dachabdichtung	Los 23 – Betonarbeiten	Los 32.1 – Kellerdecke	Los 35.3 – sonst. Maßn.
Los 07 – Brandschutzkonz.	Los 16.1 – Lichtkuppeln	Los 24 – WC-Trennwände	Los 32.2 – Innenwände	Los 36 – Gerüstunterkonst.
Los 08 – H/L/S	Los 18 – Fenster	Los 25 – Schweißarbeiten	Los 32.3 – Decken	Los 37 – Blitzschutz 2
Los 09 – Erstellung LV	Los 18.1 - Sonnenschutz	Los 26 – Abbruch Ausgänge	Los 33 – Innentüren	Los 39 – Fliesen
Los 10 – Bauwasser	Los 19 – Metall	Los 27 – Bauschließanlage	Los 34 – Maler	Los 44 – WC-Trennwände 2
Los 42 - Festellanlagen	Los 43 – Nachrüstung statische Brandfallsteuerung	Los 45 Schlosser 3 Steigleitern	Los 46 Sockelabdichtung Fassade	Los 48 Treppenhaus Gerüste
Los 17 – Blitzschutzanlage	Los 49 – Beschilderung	Los 50 Bauendreinigung	Los – Tragwerksplanung Vordach verbinder Süden	Los – TÜV Vorprüfung Erdungs und Blitzschutzanlage

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Schulzentrum Nord
Plattengebäude**



Datei: 2022-06-14_Bauzeitenplan_Schule_2041.PPL					Bauzeitenplan													Seite 1 von 1	
Projektnummer: 2041					Sanierung Schulzentrum Nord, BT: Schulgebäude, Straße der Solidarität 42, 39418 Staßfurt														
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Juni 2022			Juli 2022			August 2022				September 2022				
					KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38
1	Sanierung Bauteil Schulgebäude	109kt	Di, 14.06.22	Fr, 30.09.22	[Red bar spanning all weeks]														
1.1	Los 28 - Elektrotechnische Anlage, EG bis 3.OG	34at	Di, 14.06.22	Fr, 29.07.22	[Blue bar from KW 24 to KW 30]														
1.2	Los 28 - Elektrotechnische Anlage, Keller	25at	Mo, 01.08.22	Fr, 02.09.22	[Blue bar from KW 31 to KW 35]														
1.3	Los 29 - HLS-Arbeiten	5at	Mo, 27.06.22	Fr, 01.07.22	[Blue bar in KW 26]														
1.4	Los 31 - Bodenbelagarbeiten, Sekundarschule	5at	Mo, 27.06.22	Fr, 01.07.22	[Blue bar in KW 26]														
1.5	Los 31 - Bodenbelagarbeiten, Aufarbeitung Grundschule	10at	Mo, 08.08.22	Fr, 19.08.22	[Blue bar from KW 32 to KW 33]														
1.6	Los 32 - Trockenbauarbeiten, EG bis 3.OG	14at	Di, 14.06.22	Fr, 01.07.22	[Blue bar from KW 24 to KW 27]														
1.7	Los 32 - Trockenbauarbeiten, Kellerdeckendämmung	5at	Mo, 29.08.22	Fr, 02.09.22	[Blue bar in KW 35]														
1.8	Los 33 - Innentüren	5at	Mo, 20.06.22	Fr, 24.06.22	[Blue bar in KW 25]														
1.9	Los 34 - Malerarbeiten	34at	Di, 14.06.22	Fr, 29.07.22	[Blue bar from KW 24 to KW 30]														
1.10	Los 42 - Feststellanlagen und Freilaufobentürschließer	5at	Mo, 27.06.22	Fr, 01.07.22	[Blue bar in KW 26]														
1.11	Los 50 - Bauendreinigung, EG bis 3.OG	25at	Mo, 18.07.22	Fr, 19.08.22	[Blue bar from KW 29 to KW 33]														
1.12	Los 50 - Bauendreinigung, Keller	20at	Mo, 05.09.22	Fr, 30.09.22	[Blue bar from KW 36 to KW 39]														
1.13	Behördliche Abnahmen	45at	Mo, 01.08.22	Fr, 30.09.22	[Blue bar from KW 31 to KW 39]														

entw. mit pro-plan 7 (7.0023) | Serien-Nr.: 1472 | Lizenz für Wohnbau, Landesk. & Öff.-Anstalten

Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Mehrzweckgebäude
 (Maßnahme: 2.1.1.1.012/5077.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
Zeiträume	Projektzeitraum	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert)	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert)
	Bewilligungszeitraum	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert)	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert)
	Verwendungsnachweis	10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)	10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	1.572.009,14 € HH 22: + 827.990,86 €	10.07.2019: 183.997,97 €	10.07.2019: 643.992,89 €
	Zwischensumme	827.990,86 €	
	Gesamtsumme	3.227.990,86 €	

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 21.06.22)
Allgemein: 523.175,43 €	1.826.905,85 €	2.157.824,52 €	252.419,69 €	2.410.244,21 €	
Energetisch: 919.989,84 €		2.139.139,30 €	271.104,91 €	2.410.244,21 €	
Gesamt: 1.443.165,27					

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los 01 – Schadstoff	Los 06 – Gutachten Tragwerk	Los 11 – H/L/S	Los 15 - Dachabdichtung	Los 20 - Trockenbau
Los 02 – Gerüst Bauschild	Los 07 – Baustrom	Los 12 – nicht konstr. Abbruch	Los 16 – Fenster / Sonnenschutz	Los 21- Innentüren
Los 03 – Bauschild	Los 08 – Bauwasser	Los 13 – erw. Rohbau	Los 17 – Metall	Los 22 – Maler
Los 04 – Brandschutz-konzept	Los 09 – SiGeKo	Los 14 – Gerüst	Los 18 – WDVS	Los 23 – Bodenbelag
Los 05 – Grundleitungs-untersuchung	Los 10 - Elektro	Los 14 (2) - Baustelleneinrichtung	Los 19 – Estrich	Los 24 – Fliesen
Los 25 - Bauschließanlage	Los 26 - Rohbau 2	Los 27 – Schließanlage	Los 28 – Bauendreinigung	Los 29 – Beschilderung
Los 31 – WC Trennwände 2	Los 32- Wandschutz	Los – Tragwerksplanung Vordach Eingang Westen		

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Schulzentrum Nord
Mehrzweckgebäude**



Bauzeitplan

Fertigstellung Bau: 15.07.2022

Schulzentrum Nord – Freianlagenplanung

(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5081.7851000)

Zeit- räume	Zuwendungsbescheid	
	Zeiträume	ohne Fördermittel

Finanzie- rungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt		Zuwendungsbescheid	
	1.191.200,00 €		0,00 €	
	Gesamtsumme		1.191.200,00 €	

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 21.06.22)
---	1.218.091,69 €	1.415.115,76 €	174.902,67 €	1.590.018,43 €	
		1.484.173,48 €	105.844,95 €	1.590.018,43 €	

Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los 01 - Freianlagenplanung	Los 02 – Fernwärme	Los 03 – Grundleitungen BT Schule und MZG	Los 04 – Außenanlagen BT MZG	Los 05c – Außenanlagen BT Schule
Los 06 - SiGeKo	Los 07 - Baustelleneinrichtung			

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Schulzentrum Nord
Außengelände**



Budget Übersicht

Maßnahme	Finanzierungsplan - Gesamt	Kostenplan - Gesamt	Differenz
GS Umland	6.475.659,43 €	6.000.000,00 €	+ 475.659,43 €
GS Umland - Außenanlage	939.800,00 €	715.664,87 €	+ 224.135,13 €
SZ Nord – Plattengebäude	6.901.402,56 €	5.278.468,15 €	+ 1.622.934,41 €
SZ Nord – Mehrzweckgebäude	3.227.990,86 €	2.410.244,21 €	+ 817.746,65 €
SZ Nord – Außenanlage	1.191.200,00 €	1.590.018,43 €	- 398.818,43 €
Gesamt	18.736.052,85 €	15.994.395,66 €	+ 2.741.657,19 €
